Load Test Result (MCS)

Site Name	Enerrgic Plus Concept	Test Date	4/24/2017 8:40:40 PM
Site Code	Laborator	Test Time	36:24:58 / 54:00:00
Province	AG	MCS NO.	

Brand	Trojan	Volt.	8x6V	Ah	400 @ 10 h	Cells	24	Standby Volt.	48 V	Type	Pb-Ac	Year/Manuf.	2015	Ambient Temp.	17

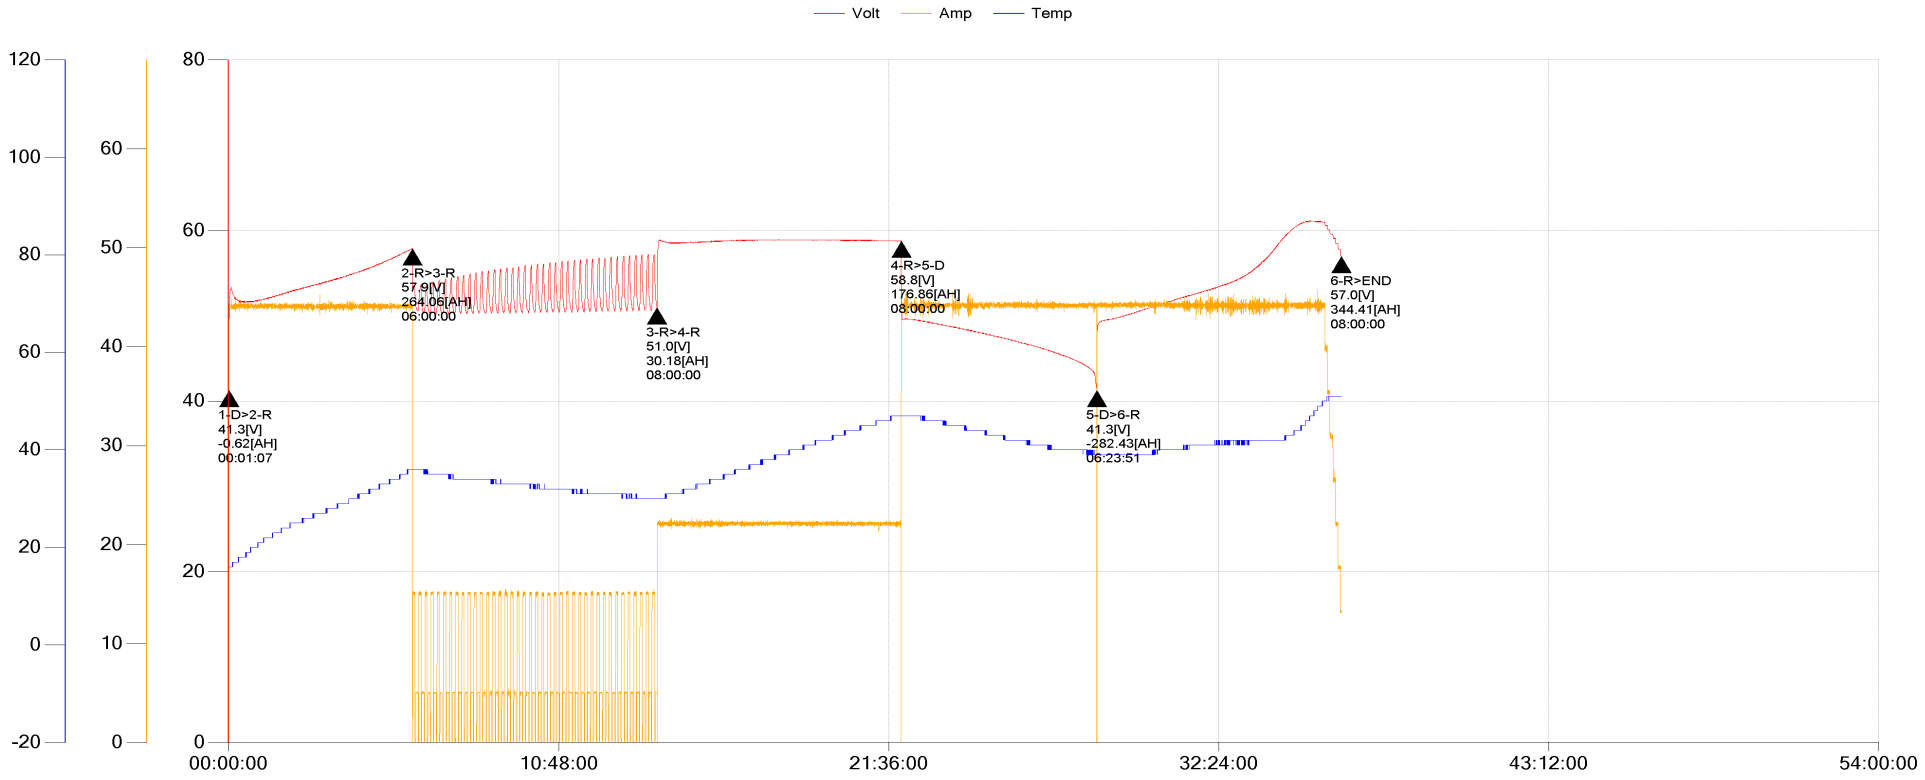

Index	Method	Pulse	Setup Time	Elapsed Time	Setup Volt	Max Volt	Min Volt	Setup Amp	AH	Temperature
1	Discharge	1	12:00:00	00:01:07	41.3	45.3	41.3	44.0	-0.6	+016
2	Restoration	1	06:00:00	06:00:00	60.4	57.9	44.4	44.0	264.1	+036
3	Restoration	4	08:00:00	08:00:00	62.4	57.2	50.2	15.0	30.2	+030
4	Restoration	2	08:00:00	08:00:00	62.4	59.0	51.1	22.0	176.9	+047
5	Discharge	1	12:00:00	06:23:51	41.3	56.7	41.3	44.0	-282.4	+039
6	Restoration	2	08:00:00	08:00:00	62.4	61.2	44.8	44.0	344.4	+051
36:24:58										
